

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN LKPI 2017**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

## BAB IV.

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

##### 4.1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4.1.1 Kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.741.980.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.55.684.832.900, realisasi anggaran sebesar Rp.54.709.165.390,- atau 98,25%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya pembangunan jalan, meliputi:

- Kabupaten Bangka : peningkatan jalan puding besar - saing - kota waringin efektif 2 Km.
- Bangka Barat : Peningkatan Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Sangku - Dam III – Saing efektif 1,5 Km.
- Belitung : Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 1) efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 2) efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Perawas - Km. 50 efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat efektif 1,5 Km.
- Belitung Timur : Peningkatan Jalan Badau - Gantung efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Km. 50 – Manggar efektif 1,5 Km, Peningkatan Jalan Gantung - Simpang Padang efektif 0,1 Km, Peningkatan Jalan Badau - Gantung (Paket 2) efektif 0,02 Km.

	
Peningkatan Jalan Parit 3 – Tanjung Ru Kab. Bangka Barat	Peningkatan Jalan Km. 50 – Manggar Kab. Belitung Timur

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.1.2 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.261.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.538.918.514,- atau 23,83%. Keluaran kegiatan adalah

Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan, yaitu: DED Jembatan Ruas Jalan Perawas - Km. 50 - Manggar Kabupaten Belitung/Belitung Timur 1 Dokumen, Pra Fs Jembatan Bangka Sumatera (gagal lelang).



• **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Lelang pertama dinyatakan gagal karena daftar pendek jumlah penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan teknis kurang dari tiga, lelang ulang ke dua gagal karena berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan lelang ulang ketiga gagal karena tidak ada peserta (penyedia jasa) yang lulus evaluasi teknis.

**Solusi:**

- 1.

4.1.3 Kegiatan Pembangunan Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.161.984.250,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.50.479.484.300,- realisasi anggaran sebesar Rp.49.678.761.500,- atau 98,41%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan jembatan, meliputi:

- Kabupaten Bangka Tengah : Pembangunan Jembatan Keretak, Pembangunan Jembatan Trubus, Pembangunan Jembatan Sadap,
- Kabupaten Bangka Selatan : Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lampung - Air Bara.
- Kabupaten Bangka : Pembangunan Jembatan Penagan, Pembangunan Jembatan Peludin



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.1.4 Kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK) dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.541.065.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.14.632.585.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.13.115.309.500,- atau 89,63%. Keluaran kegiatan adalah terbangunnya jembatan, yaitu :

Kabupaten Bangka Tengah : Pembangunan Jembatan Nadi, Pembangunan Jembatan Lubuk Lingkup

	
<p>Pembangunan Jembatan Nadi Kab. Bangka Tengah</p>	<p>Pembangunan Jembatan Lubuk Lingkup Kab. Bangka Tengah</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.1.5 Kegiatan Pembangunan Jalan untuk dihibahkan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.3.318.174.200,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.086.778.500,- atau 93,03%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan jalan, meliputi:

- Kabupaten Bangka Tengah : Pembangunan Jalan Komplek Brimob, panjang efektif 0,7 Km.
- Kota Pangkalpinang: Pengaspalan Jalan Klenteng Sheng Mu Miao, panjang efektif 0,304 Km.

	
Pembangunan Jalan Komplek Brimob Kab. Bangka Tengah	Pengaspalan Jalan Klenteng Sheng Mu Miao Kota Pangkalpinang

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

4.2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.2.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.310.140.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.87.121.381.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.85.755.562.746,- atau 98,43%. Keluaran kegiatan adalah Terpeliharanya jalan yang terdiri dari:

- Kota Pangkalpinang : Pemeliharaan Berkala Jalan Pulau Bangka efektif 2,55 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Batas Kota (Simpang Katis); A. Yani; Simpang Semabung - Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Ketapang - Pasir Padi; PPI; Simpang Pulau Bangka – Sampur Fungsional 28,64 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Alexander fungsional 20,13 Km.
- Kabupaten Bangka : Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur (Paket 1) efektif 5 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur (Paket 2) efektif 4 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu efektif 2 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur efektif 2 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar – Sungailiat dengan fungsional 29,6 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu dengan fungsional 25,75 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin dengan fungsional 21,8 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung dengan fungsional 34,4 Km.
- Kabupaten Bangka Tengah : Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; - Sungai Selan efektif 1,5 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Koba - Lubuk Besar efektif 2,5 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; Simpang Katis - Sungai Selan dengan fungsional 33,41 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Simpang Katis; Puput - Lampur (Simpang Gedong); Sungai Selan – Lampur dengan fungsional 32,55

- Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan; Penagan - Tanjung Tedung dengan fungsional 16,8 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar dengan fungsional 35,9 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat dengan fungsional 32 Km.
- Kabupaten Bangka Selatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai Selan - Lampur - Air Bara efektif 4 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung – Payung efektif 4 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lampur - Air Bara dengan fungsional 61,26 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas – Bedengung dengan fungsional 21,6 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Bedengung - Batu Betumpang; Bedengung – Payung dengan fungsional 33,7 Km.
  - Kabupaten Bangka Barat: Pemeliharaan Rutin Jalan Ibul - Parit Tiga dengan fungsional 23,45 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru dengan fungsional 26,78 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang; Sangku - Dam III - Saing; Simpang Tempilang – Sangku dengan fungsional 48,78 Km.
  - Kabupaten Belitung : Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan; Tanjung Pandan - Simpang Empat dengan fungsional 32,09 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Junction - Membalong dengan fungsional 40,64 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - KM. 50 dengan fungsional 27,9 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat - Pesarakan – Buding dengan fungsional 16,40 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Gantung; Bantan – Pelulusan dengan fungsional 17 Km.
  - Kabupaten Belitung Timur : Pemeliharaan Rutin Jalan Badau – Gantung dengan fungsional 63,87 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggiang - Gantung; Gantung - Simpang Padang dengan fungsional 33,6 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan KM. 50 – Manggar dengan fungsional 44,09 Km.

	
<p>Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Timur (Paket 2) Kab. Bangka</p>	<p>Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai selan – Lampur – Air Bara</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.2.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.290.935.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.15.363.285.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.13.994.420.000,- atau 91,09%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharannya jalan, yaitu

- Kabupaten Bangka : Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar – Sungailiat efektif 2 Km
- Kabupaten Bangka Barat : Pemeliharaan Berkala Jalan Ibul - Parit Tiga efektif 5 Km.

	
<p>Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar – Sungailiat Kab. Bangka</p>	<p>Pemeliharaan Berkala Jalan Ibul – Parit Tiga Kab. Bangka Barat</p>

• **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.2.3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.068.080.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.832.919.235,- atau 77,98%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, yaitu:

- Pemeliharaan Rutin Jembatan Rangka Baja Ruas Jalan Provinsi Di Pulau Belitung.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Rangka Baja Ruas Jalan Provinsi Di Pulau Bangka.

	
<p>Pemeliharaan Rutin Jembatan Rangka Baja Ruas Jalan Provinsi di Pulau Bangka</p>	<p>Pemeliharaan Rutin Jembatan Rangka Baja Ruas Jalan Provinsi di Pulau Belitung</p>

- **Permasalahan dan Solusi**


**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.2.4. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.998.020.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.412.862.982,- atau 70,71%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan Baturusa II.

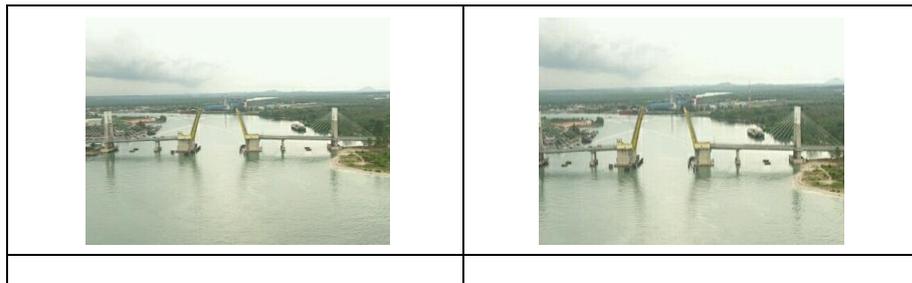

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Penerangan Jembatan masih minim;
2. SOP buka tutup jembatan belum ada.

**Solusi:**

1. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk pemasangan rambu buka tutup berupa lampu lalu lintas di beberapa titik menuju jembatan Baturusa II;
2. Perlu koordinasi lanjutan dengan Dinas Perhubungan dan melibatkan KSOP Pangkalbalam, Distrik Navigasi kelas II Palembang, Pelindo II Pangkalbalam dan pihak lain terkait.

4.2.5. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk dihibahkan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.214.110.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.202.662.500,- atau 99,06%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jalan, yaitu Rehabilitasi Areal Perkantoran Mapolda Babel, panjang efektif 0,5 Km.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

4.3.1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.308.180.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.278.854.700,- atau 90,48%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya alat-alat berat untuk menunjang kegiatan kebinamargaan, terdiri dari:



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.3.2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.34.234.500,- atau 97,40%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya alat-alat ukur dan bahan laboratorium untuk menunjang kegiatan kebinamargaan, terdiri dari:



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.4. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4.4.1. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.384.476.000,- atau 96,12%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, yaitu:

- Kabupaten Bangka Selatan : Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I R Serdang Pergam sepanjang 1000 Meter
- Kabupaten Bangka Barat : Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Buleng sepanjang 1000 Meter



4.4.2. Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.472.000.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.6.573.253.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.5.718.163.000,- atau 86,99%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi yang terdiri dari:

- Kabupaten Bangka Selatan: Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Jeriji 2,5 Ha, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam 50 Ha
- Kabupaten Bangka Barat: Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Buleng 40 Ha



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:.**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.5. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

4.5.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.060.860.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.21.530.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 21.530.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan.

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Peningkatan Sumber Daya Air Baku Kec. Tukak Sadai tidak dapat terlaksana karena adanya pengurangan anggaran (Rasionalisasi Anggaran).

**Solusi:**

1. -

4.6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

4.6.1. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.105.970.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.063.769.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.763.049.000,- atau 71,73%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya, yaitu Konservasi pengembangan dan pengelolaan SDA Desa Nyelanding 1000 M'.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Konservasi Pengembangan dan Pengelolaan SDA Air Bara tidak terlaksana karena Rasionalisasi Anggaran

**Solusi:**

1. Ditinjau kembali untuk tahun berikutnya

4.7. Program Pengendalian Banjir

4.7.1. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.323.150.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.13.616.877.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.13.187.769.850,- atau 96,85%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai/kali yang terdiri dari:

- Pangkalpinang: Normalisasi Saluran Banjir Pasir Garam Pangkalpinang 105 M', Normalisasi Saluran Banjir Air Kelubi Kelurahan Tua Tunu 150 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Parit Lalang I, 700 M', Normalisasi Saluran Banjir Kerabut - I Kel. Jeramba Gantung 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Jl. Air Mangkok Kel. Air Mawar 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Selindung Lama 300 M', Normalisasi Saluran Banjir Jln. Air Itam – I 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Tuatunu 800 M'.
- Kabupaten Bangka: Normalisasi Saluran Banjir Desa Dalil 980 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kapuk 100 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Duren Bangka 720 M', Normalisasi Saluran Banjir Kampung Nelayan – II 670 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Abik Belinyu 810 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Payabenua 780 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Bakam 652 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tutut 705 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Ruay 567 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Riding Panjang Belinyu 753 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Zed Kec. Mendo Barat 640 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Gunung Muda Kec. Belinyu 680 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Sinar Jaya Jelutung kec. Sungailiat 585 M'.
- Kabupaten Bangka Tengah: Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Celuak 600 M', Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Malik 650 M', Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Pinang Sebatang 900 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Jelutung 413 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Cambai Selatan 850 M', Normalisasi

Saluran Banjir Desa Pedindang 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Tanah Merah 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Namang 1000 M', Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Padang Baru 679 M, Normalisasi dan Pengerukan Saluran Banjir Desa Lampur 785 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Baskara Bakti 600 M', Normalisasi dan Pengerukan Kolong Krasak 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kerantai 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Beruas 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Jelambar 725 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kerakas Kec. Sungaiselan 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Cambai Kec. Namang 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Padang Mulya Kec. Koba 350 M'.

- Kabupaten Bangka Barat : Normalisasi Saluran Banjir Desa Ranggi 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Petar 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Dendang 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Bulin I 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Jembatan Tambang 6 Desa Tugang 1200 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Pal – I 750 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tanjung Ular 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Kel. Sungai Baru 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Teluk Rubia 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Kampung Tanjung 650 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Daya Baru 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Daeng 700 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Pait Jaya 800 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Perak 850 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Semulut 700 M', Normalisasi Saluran Banjir KSM Gelut Jalan Panglima Angin Kec. Tempilang 750 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Mancung Kelapa 450 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tumbak Petar Kec. Jebus 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Tugang Dusun Pisang Kec. Kelapa 1200 M', Normalisasi Saluran Banjir Air Selawe Desa Ranggi Kec. Jebus 600 M'.
- Kabupaten Bangka Selatan : Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Gegas 450 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Malik Lama 1000 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Ranggas 750 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Bedengung 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Sengir 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Bencah 600 M', Normalisasi Saluran Banjir Sungai Desa Pangkal Buluh 400 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Payung 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Paku 550 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Sadai 500 M'.
- Kabupaten Belitung : Normalisasi Saluran Banjir Desa Simpang Rusa Kec. Membalong 541 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan 105 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Sijuk 280 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Merbau 149 M', Normalisasi Saluran Banjir Jl. Air Baik RT 34/08 Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan 500 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Air Raya Barat III Desa Air Raya Tanjungpandan 130 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Air Raya Timur II Desa Air Raya Tanjungpandan 111 M', Normalisasi Saluran Banjir Air Batu Buding 240 M'.

- Kabupaten Belitung Timur : Normalisasi Saluran Banjir Desa Buding Kec. Kelapa Kampit 645 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Selingsing Kec. Gantung 475 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Padang Kec. Manggar 670 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Limbungan Kec. Gantung 270 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Lilangan Kec. Gantung 230 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Lenggang Kec. Gantung 168 M', Normalisasi Saluran Banjir Dusun Sebrang Kec. Gantung 92 M', Normalisasi Saluran Banjir Jalan Beringin RT 04 Kec. Gantung 160 M', Normalisasi Saluran Banjir Jalan Dewi Sartika RT.07 Kec. Gantung 118 M', Normalisasi Saluran Banjir Jalan Kenanga RT.06 Kec. Gantung 132 M', Normalisasi Saluran Banjir Desa Padang Kec. Manggar 290 M', Normalisasi Saluran Banjir Areal Pengembangan Pemukiman Aik Pisang Kec. Gantung 220 M', Normalisasi Saluran Banjir Buding Kec. Kelapa Kampit 290 M', Normalisasi Saluran Banjir Kampung Baru 118 M'.
- Pengerukan sungai/Kali (kabupaten Bangka Barat dan Bangka Barat) swakelola sepanjang 8300 M'.
- Pengerukan sungai/Kali (Kota Pangkalpinang, kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan) swakelola sepanjang 4000 M'.
- Pengerukan sungai/Kali (kabupaten Belitung dan Belitung Timur) swakelola sepanjang 7100 M'.

	
<p>Normalisasi Saluran Banjir Pasir Garam Pangkalpinang</p>	<p>Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.7.2. Kegiatan Perencanaan Pengendalian Banjir dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.486.440.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.60.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.58.070.000,- atau 96,78%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya perencanaan pengendalian Banjir, 1 dokumen. Yaitu DED Pembangunan Pintu Air Desa Mempayak.



DED Pembangunan Pintu Air Desa Mempayak

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:.**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4.8.1. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.302.330.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.93.558.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 93.558.500,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong.

- **Permasalahan dan Solusi**


**Permasalahan:**

1. Pembangunan Talud Desa Air Batu Kec. Badau, Pembangunan Talud Pengaman Pantai Pering Kec. Kelapa Kampit, dan Pembangunan Talud Sungai Cuilong Kec. Muntok tidak dapat terlaksana karena pengurangan Anggaran.

**Solusi:**

1. Ditinjau kembali untuk anggaran tahun berikutnya.

4.8.2. Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.732.360.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.366.180.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.355.920.000,- atau 97,20%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya perencanaan turap/talud/bronjong, 1 Dokumen yaitu DED Pemecah Ombak Pantai Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat.

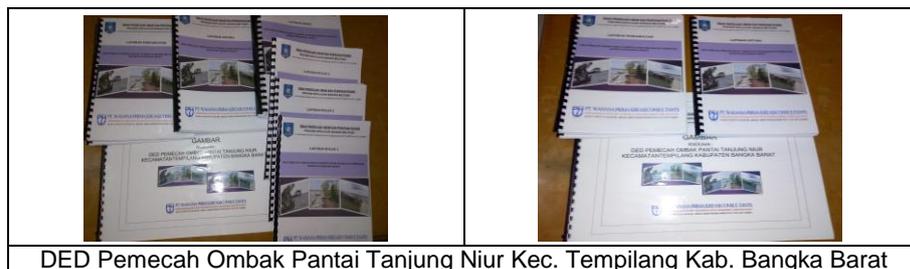

DED Pemecah Ombak Pantai Tanjung Niur Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:.**

1. -

**Solusi:**

1. -

4.9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4.9.1. Kegiatan Pengadaan lahan Jalan Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.045.241.450,- realisasi anggaran sebesar Rp.212.338.390,- atau 1,51%. Keluaran kegiatan adalah Lahan keperluan prasarana pemerintah provinsi kepulauan bangka Belitung.

- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Proses konsinyasi di PN Sungailiat tidak berjalan optimal, sehingga proses penitipan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah Jl. Lintas Timur Kab. Bangka tidak bisa terserap.
2. Belum terlaksana proses pembuatan akta hibah sehingga pada tahapan tersebut belum dilakukan proses pemisahan sertifikat oleh pihak BPN Kota Pangkalpinang

**Solusi:**

1. Agar proses pembuatan akta hibah dalam segera dilakukan sehingga proses pemisahan sertifikat tanah bisa dapat dibuat

## 5. URUSAN PENATAAN RUANG

5.1. Program Perencanaan Tata Ruang

5.1.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.751.510.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.729.881.000,- atau 97,12%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. Belum mendapatkan rekomendasi peta tematik dari Badan Informasi Geospasial

**Solusi:**

1. Perlu lebih intensif kembali dalam pendampingan Konsultan dalam rapat asisitensi dalam pemberian rekomendasi dari BIG di Cibinong
2. Perlu diaktifkan secara optimal fungsi PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) di Universitas Bangka Belitung, sehingga OPD Dinas PUPR lebih akselerasi dalam mendapatkan rekomendasi BIG.

5.1.2. Kegiatan Pengadaan Alat Survey dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.701.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.655.338.300,- atau 97,29%. Keluaran kegiatan adalah Alat survey pelanggaran pemanfaatan ruang, yang terdiri dari: Drone 1 unit, Alat Survey dan Pemetaan Total Station 1 unit, GPS Geodetic 3 unit, dan GPS handle 3 unit.



- **Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan:**

1. -

**Solusi:**

1. -

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN**  
**DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

**A. Tugas Pembantuan**

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kementerian/Lembaga : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Keterangan
				(Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>13.286.172.000</b>		<b>13.242.295.000</b>	<b>100,00</b>		
	a. Pemeliharaan Rutin Jalan		2.497.950.000	7.104.571.000	100,00	71,25 Km	
	b. Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan		9.821.170.000	9.821.170.000	100,00	3,5 Km	
	c. Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		160.268.000	160.108.000	100,00	12 layanan	
	d. Layanan Internal (Overhead)		806.784.000	806.640.000	100,00	12 layanan	
<b>II.</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>2.207.100.000</b>		<b>1.949.183.000</b>	<b>100,00</b>		
	a. Jaringan Irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara		1.787.126.000	1.543.112.000	100,00	80,00 km	
	b. Layanan Perkantoran (Overhead)		419.974.000	406.072.000	100,00	12 layanan	

## LAPORAN REALISASI BELANJA OPD TAHUN ANGGARAN 2017

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Nama Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				%	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>321,707,643,013.00</b>	<b>293,006,146,064.00</b>	<b>96.96</b>	<b>266,763,313,263.99</b>	<b>91.04</b>	<b>26,242,832,800.01</b>	<b>8.96</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>16,316,988,313.00</b>	<b>16,827,663,633.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,776,825,503.00</b>	<b>93.76</b>	<b>1,050,838,130.00</b>	<b>6.24</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>305,390,654,700.00</b>	<b>276,178,482,431.00</b>	<b>93.91</b>	<b>250,986,487,760.99</b>	<b>90.88</b>	<b>25,191,994,670.01</b>	<b>9.12</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,686,614,000.00</b>	<b>2,735,851,581.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,279,893,480.00</b>	<b>83.33</b>	<b>455,958,101.00</b>	<b>16.67</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	5,662,200.00	56.62	4,337,800.00	43.38
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000.00	252,657,581.00	100.00	162,789,895.00	64.43	89,867,686.00	35.57
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	299,640,000.00	266,220,000.00	100.00	266,100,000.00	99.95	120,000.00	0.05
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39,000,000.00	39,000,000.00	100.00	38,981,000.00	99.95	19,000.00	0.05
5	Penyediaan Alat Tulis	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00	72,000,000.00	100.00	-	-
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	49,994,700.00	76.91	15,005,300.00	23.09
7	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	23,978,150.00	95.91	1,021,850.00	4.09
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,624,000.00	24,624,000.00	100.00	24,120,000.00	97.95	504,000.00	2.05
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,200,000.00	20,200,000.00	100.00	15,589,000.00	77.17	4,611,000.00	22.83
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00	58,736,000.00	78.31	16,264,000.00	21.69
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500,000,000.00	550,000,000.00	100.00	549,970,759.00	99.99	29,241.00	0.01
12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	348,000,000.00	348,000,000.00	100.00	325,600,000.00	93.56	22,400,000.00	6.44
13	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) berubah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)	858,150,000.00	858,150,000.00	100.00	556,611,514.00	64.86	301,538,486.00	35.14
14	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	100,000,000.00	130,000,000.00	100.00	129,760,262.00	99.82	239,738.00	0.18
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>792,060,000.00</b>	<b>749,344,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>591,073,360.00</b>	<b>78.88</b>	<b>154,882,640.00</b>	<b>20.67</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	148,250,000.00	148,250,000.00	100.00	134,350,000.00	90.62	13,900,000.00	9.38
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	82,284,000.00	100.00	78,896,000.00	95.88	3,388,000.00	4.12
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	333,810,000.00	333,810,000.00	100.00	228,351,360.00	68.41	105,458,640.00	31.59
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	26,967,000.00	44.95	33,033,000.00	55.06
5	Rehabilitasi Gedung Kantor	250,000,000.00	125,000,000.00	100.00	122,509,000.00	98.01	2,491,000.00	1.99
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>140,334,614.00</b>	<b>82.55</b>	<b>29,665,386.00</b>	<b>17.45</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	170,000,000.00	170,000,000.00	100.00	140,334,614.00	82.55		

No	Nama Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
				%	Rp.	%	Rp.	%
	<b>D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>344,985,000.00</b>	<b>344,985,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>154,641,600.00</b>	<b>44.83</b>	<b>190,343,400.00</b>	<b>55.17</b>
1	Worksshop Sinkronisasi Program Infrastruktur	119,670,000.00	119,670,000.00	100.00	75,052,600.00	62.72	44,617,400.00	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180,815,000.00	180,815,000.00	100.00	54,110,000.00	29.93	126,705,000.00	
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44,500,000.00	44,500,000.00	100.00	25,479,000.00	57.26	19,021,000.00	
	<b>E Program Pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>131,706,629,250.00</b>	<b>126,376,676,400.00</b>	<b>90.00</b>	<b>121,128,933,404.00</b>	<b>95.85</b>	<b>5,247,742,996.00</b>	<b>4.15</b>
1	Pembangunan Jalan	57,741,980,000.00	55,684,832,900.00	100.00	54,709,165,390.00	98.25	975,667,510.00	1.75
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	2,261,600,000.00	2,261,600,000.00	50.00	538,918,514.00	23.83	1,722,681,486.00	76.17
3	Pembangunan Jembatan	57,161,984,250.00	50,479,484,300.00	100.00	49,678,761,500.00	98.41	800,722,800.00	1.59
4	Pembangunan Jembatan (DAK)	14,541,065,000.00	14,632,585,000.00	100.00	13,115,309,500.00	89.63	1,517,275,500.00	10.37
5	Pembangunan Jalan untuk Dihilangkan	-	3,318,174,200.00	100.00	3,086,778,500.00	93.03	231,395,700.00	6.97
	<b>F Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</b>	<b>5,034,690,000.00</b>	<b>459,738,500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>449,478,500.00</b>	<b>97.77</b>	<b>10,260,000.00</b>	<b>2.23</b>
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4,302,330,000.00	93,558,500.00	-	93,558,500.00	100.00	-	-
2	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	732,360,000.00	366,180,000.00	100.00	355,920,000.00	97.20	10,260,000.00	2.80
	<b>G Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>111,667,175,000.00</b>	<b>106,764,876,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>103,198,427,463.00</b>	<b>96.66</b>	<b>3,566,449,037.00</b>	<b>3.34</b>
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	93,310,140,000.00	87,121,381,500.00	100.00	85,755,562,746.00	98.43	1,365,818,754.00	1.57
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	15,290,935,000.00	15,363,285,000.00	100.00	13,994,420,000.00	91.09	1,368,865,000.00	8.91
3	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	1,068,080,000.00	1,068,080,000.00	100.00	832,919,235.00	77.98	235,160,765.00	22.02
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	1,998,020,000.00	1,998,020,000.00	100.00	1,412,862,982.00	70.71	585,157,018.00	29.29
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk Dihilangkan	-	1,214,110,000.00	100.00	1,202,662,500.00	99.06	11,447,500.00	0.94
	<b>H Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>343,330,000.00</b>	<b>343,330,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>313,089,200.00</b>	<b>91.19</b>	<b>30,240,800.00</b>	<b>8.81</b>
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	308,180,000.00	308,180,000.00	100.00	278,854,700.00	90.48	29,325,300.00	9.52
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan	35,150,000.00	35,150,000.00	100.00	34,234,500.00	97.40	915,500.00	2.60
	<b>I Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>6,872,000,000.00</b>	<b>6,973,253,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,102,639,000.00</b>	<b>87.51</b>	<b>870,614,000.00</b>	<b>12.49</b>
1	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	384,476,000.00	96.12	15,524,000.00	3.88
2	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	6,472,000,000.00	6,573,253,000.00	100.00	5,718,163,000.00	86.99	855,090,000.00	13.01
	<b>J Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku</b>	<b>1,060,860,000.00</b>	<b>21,530,000.00</b>	<b>-</b>	<b>21,530,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	Nama Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran		
				%	Rp.	%	Rp.	%	
	1	Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku	1,060,860,000.00	21,530,000.00	-	21,530,000.00	100.00	-	-
	<b>K</b>	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan sumber daya air</b>	<b>2,105,970,000.00</b>	<b>1,063,769,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>763,049,000.00</b>	<b>71.73</b>	<b>300,720,000.00</b>	<b>28.27</b>
	1	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya	2,105,970,000.00	1,063,769,000.00	100.00	763,049,000.00	71.73	300,720,000.00	28.27
	<b>L</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>27,809,590,000.00</b>	<b>13,676,877,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,245,840,450.00</b>	<b>96.85</b>	<b>431,036,550.00</b>	<b>3.15</b>
	1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	26,323,150,000.00	13,616,877,000.00	100.00	13,187,769,850.00	96.85	429,107,150.00	3.15
	2	Perencanaan Pengendalian Banjir	1,486,440,000.00	60,000,000.00	100.00	58,070,600.00	96.78	1,929,400.00	3.22
	<b>M</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>751,510,000.00</b>	<b>2,453,010,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,385,219,300.00</b>	<b>97.24</b>	<b>67,790,700.00</b>	<b>2.76</b>
	1	Penyusunan Rencana Detail Tata ruang Kawasan	751,510,000.00	751,510,000.00	100.00	729,881,000.00	97.12	21,629,000.00	2.88
	2	Pengadaan Alat Survey	-	1,701,500,000.00	100.00	1,655,338,300.00	97.29	46,161,700.00	2.71
	<b>N</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>14,045,241,450.00</b>	<b>14,045,241,450.00</b>	<b>70.00</b>	<b>212,338,390.00</b>	<b>1.51</b>	<b>13,832,903,060.00</b>	<b>98.49</b>
	1	Pengadaan Lahan JL. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander	14,045,241,450.00	14,045,241,450.00	70.00	212,338,390.00	1.51	13,832,903,060.00	98.49
